



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **CIS Taranto**

---

- ***Sintesi dello stato di attuazione degli interventi***
- ***Stato di attuazione interventi per settori***
- ***Focus su interventi significativi***

**Taranto, 24 Aprile 2019**

## ***Sintesi dello stato di attuazione interventi***

## ***Il CIS Taranto in numeri***

---

**Nell'ambito delle attività previste dal Contratto Istituzionale per l'area di Taranto si stanno portando avanti 40 interventi per un valore complessivo di investimenti di oltre 1 miliardo di euro.**

**A dicembre 2018, l'avanzamento finanziario della spesa erogata è pari a 311,4 milioni di euro (pari al 31% della dotazione finanziaria CIS)**

**L'avanzamento fisico e procedurale degli interventi è il seguente:**

- **10 interventi conclusi per un importo pari a 92,2 milioni di euro;**
- **12 interventi in corso di realizzazione per un importo di 709,3 milioni di euro;**
- **1 in fase di affidamento lavori/servizi/forniture per un importo di 70 milioni di euro;**
- **10 interventi in progettazione e in fase di avvio per un importo pari a 109,5 milioni di euro;**
- **7 interventi non avviati/bloccati (di cui 4 relativi alla riqualificazione del Quartiere Tamburi e quindi di prossima attivazione per complessivi 82 milioni) per un importo di 97,2 milioni di euro.**

## ***Stato di attuazione interventi per settori***


---







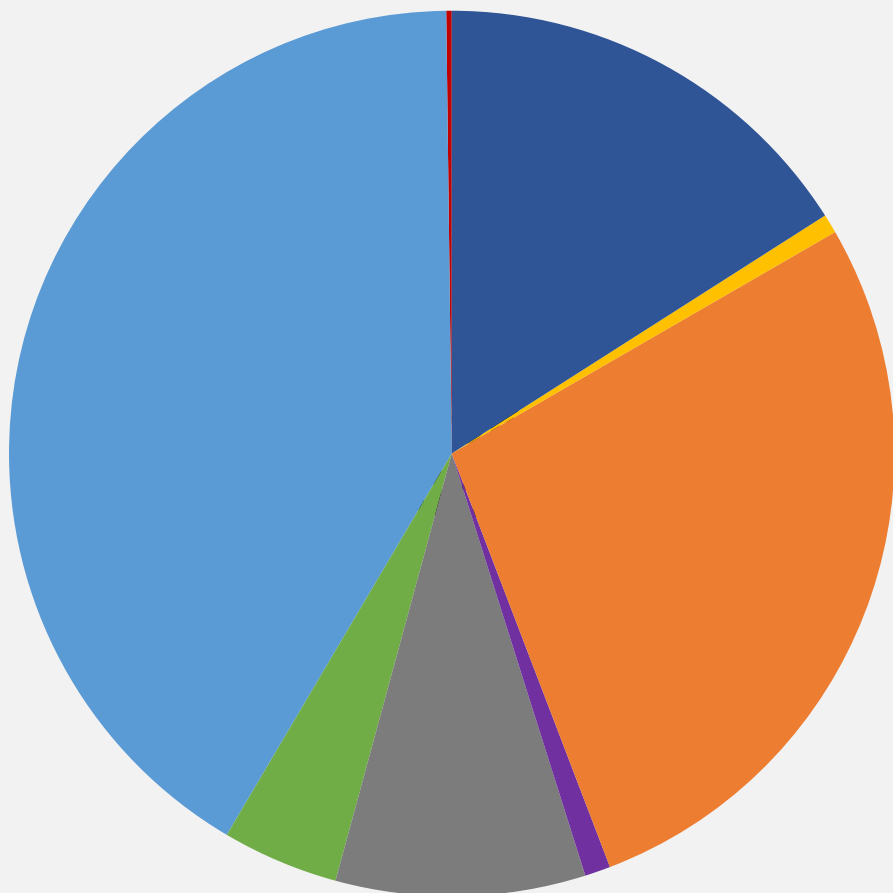

## Avanzamento del Programma di Interventi del CIS per settori

Il CIS Taranto è uno strumento che gestisce una pluralità di interventi multidisciplinari, ritenuti strategici per lo sviluppo economico, ambientale e sociale del territorio tarantino, finalizzati al raggiungimento di obiettivi diversi in base all'ambito settoriale di appartenenza. 8 sono i principali settori su cui incidono gli interventi del CIS.

Settore	Importo finanziato al IV trim. 2018 (€)	Incidenza sul CIS (%)	Spesa realizzata al IV trim. 2018 (€)	Incidenza spesa settore sul totale finanziato CIS (%)	Incidenza spesa settore su totale spesa realizzata CIS (%)	Spesa realizzata alla sottoscrizione 30.12.2015 (€)	Variazione della spesa al 2015-2018 (%)
Ambiente	€ 161.000.759,70	15,97%	€ 17.713.204,56	1,76%	5,7%	€ 2.207.386,94	87,5%
Infrastrutture portuali e trasporti	€ 416.644.000,00	41,32%	€ 270.415.219,47	26,82%	86,8%	€ 76.401.030,52	71,7%
Sanità	€ 277.500.000,00	27,52%	€ 4.300.000,00	0,43%	1,4%	€ 0,00	100,0%
Rigenerazione urbana	€ 91.835.363,00	9,11%	€ 1.510.419,80	0,15%	0,5%	€ 0,00	100,0%
Riqualificazione e adeguamento edifici scolastici	€ 9.458.551,92	0,94%	€ 7.033.986,09	0,70%	2,3%	€ 762.539,82	89,2%
Recupero infrastrutturale e valorizzazione turistica Arsenale Militare	€ 42.893.000,00	4,25%	€ 3.643.264,49	0,36%	1,2%	€ 0,00	100,0%
Beni e attività culturali per la promozione turistica	€ 7.023.708,71	0,70%	€ 6.823.626,34	0,68%	2,2%	€ 2.127.249,43	68,8%
Azioni di Sistema a supporto dell'accelerazione degli interventi	€ 2.000.000,00	0,20%	€ 0,00	0,00%	0,0%	€ 0,00	0,0%
<b>Totale CIS</b>	<b>€ 1.008.355.383,33</b>	<b>100%</b>	<b>€ 311.439.720,75</b>	<b>30,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 81.498.206,71</b>	<b>73,8%</b>

# Incidenza degli importi finanziati per settore sul totale CIS (%)



15,9 %	 AMBIENTE	RISORSE 161 Mln €	PROGETTI 12
0,7 %	 BENI E ATTIVITÀ CULTURALI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	RISORSE 7 Mln €	PROGETTI 2
27,5 %	 SANITÀ	RISORSE 277,5 Mln €	PROGETTI 2
0,9 %	 RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	RISORSE 9,4 Mln €	PROGETTI 7
9,1 %	 RIGENERAZIONE URBANA	RISORSE 91,8 Mln €	PROGETTI 8
4,2 %	 RECUPERO INFRASTRUTTURALE E VALORIZZAZIONE TURISTICA ARSENALE MILITARE	RISORSE 42,8 Mln €	PROGETTI 2
41,3 %	 INFRASTRUTTURE PORTUALI E TRASPORTI	RISORSE 416,6 Mln €	PROGETTI 5
0,2 %	 AZIONI DI SISTEMA	RISORSE 2 Mln €	PROGETTI 2

## Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Settore Ambiente (1/2)

Sono 12 gli interventi destinati alla bonifica e ambientalizzazione dei territori e dei bacini ricadenti nell'area di Taranto, con un importo complessivo pari a circa 161 milioni di euro che rappresenta il circa il 16% delle risorse del

SETTORE AMBIENTE						
Stato di avanzamento fisico procedurale	Cod. CIS	Titolo Intervento	Costo Intervento (€)	Costo realizzato al IV trimestre 2018 (€)	Commento sullo stato di attuazione	Previsioni dichiarate alla sottoscrizione
In corso di realizzazione (3 interventi per un importo complessivo pari a 85.8 ML €)	2.2	Messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad	€ 10.000.000,00	€ 2.937.880,46	Inizio lavori II trimestre 2017. Collaudo previsto per il IV trimestre 2019.	Inizio lavori IV trimestre 2016
	2.5	Interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del bacino del MAR Piccolo-I Seno di Taranto e delle aree ad esso prospicienti	€ 55.000.000,00	€ 7.520.463,57	Intervento complesso si articola in 9 sotto-progetti. Conclusa attività H e B, in corso di realizzazione attività A. Fine lavori previsti per IV trimestre 2019. In ritardo rispetto alle previsioni	Fine lavori prevista per IV trimestre 2017
	2.6	Piattaforma per un sistema integrato di riqualificazione dell'area vasta di crisi ambientale comprensive di attività di monitoraggio e tecniche innovative sperimentali - I stralcio funzionale	€ 20.800.000,00	€ 4.232.393,78	Intervento complesso si articola in 4 sotto-progetti più una quinta fase inserita al I trim 2017 di Comunicazione (convegni, incontri, forum). L'attività E risulta conclusa, le attività A e C in esecuzione.	Fine del progetto di fattibilità tecnica IV trimestre 2016
In affidamento	2.1	Messa in sicurezza terreni e falda aree industriali Comune di Statte: completamento della caratterizzazione, progettazione e realizzazione intervento. Bonifica ambientale con misure di sicurezza della falda profonda della zona PIP di Statte.	€ 37.000.000,00	€ 1.180.649,40	Per ciò che concerne l'attività di messa in sicurezza permanente, è in corso l'elaborazione del progetto definitivo Per l'attività di messa in sicurezza d'emergenza è in corso la verifica del possesso dei requisiti e stipula contratto da parte del Comune	Messa in sicurezza di emergenza. Inizio progettazione definitiva II trimestre 2016. Messa in sicurezza permanente. Fine progettazione definitiva II trimestre 2016.
	2.3	Caratterizzazione, analisi di rischio e bonifica aree non pavimentate Cimitero San Brunone - Quartiere Tamburi	€ 11.023.759,70	€ 306.325,59	Il progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Commissario Straordinario ed è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori	Fine progettazione definitiva II trimestre 2016.

## Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Settore Ambiente (2/2)

SETTORE AMBIENTE						
Stato di avanzamento fisico procedurale	Cod. CIS	Titolo Intervento	Costo Intervento (€)	Costo realizzato al IV trimestre 2018 (€)	Commento sullo stato di attuazione	Previsioni dichiarate alla sottoscrizione
In fase di avvio (4 interventi per un importo complessivo di 12 ML €)	5.3	Interventi per la riqualificazione ambientale del Comune di Statte	€ 3.000.000,00	€ 0	Nessuna variazione significativa si registra rispetto alla sottoscrizione.	Progettazione esecutiva prevista per I trim. 2019
	5.4	Interventi per la riqualificazione ambientale del Comune di Crispiano	€ 3.000.000,00	€ 0	Nessuna variazione significativa si registra rispetto alla sottoscrizione.	Intervento composto da 2 sub-attività. Progettazione esecutiva prevista per I trim. 2019 (attività realizzazione rete scolante)
	5.5	Interventi per la riqualificazione ambientale del Comune di Montemesola	€ 3.000.000,00	€ 0	La conclusione della progettazione esecutiva è prevista per il I semestre 2019.	Progettazione esecutiva prevista per il IV trim 2018.
	5.6	Interventi per la riqualificazione ambientale del Comune di Massafra	€ 3.000.000,00	€ 0	La conclusione della progettazione esecutiva è prevista per il I semestre 2019 per tutte e quattro le attività che compongono l'intervento.	Intervento composto da 4 sotto-progetti per tre dei quali la progettazione esecutiva è pianificata per il IV trim 2018
In azione di sblocco (3 interventi per un importo complessivo pari a 15,1 ML €)	2.10	Completamento del progetto dell'utilizzo industriale (ILVA) delle acque reflue di Taranto per uso potabile ed irriguo	€ 14.000.000,00	€ 716.098,12	<b>Intervento non avviato</b>	Avvio predisposizione progetto di fattibilità tecnica prevista al I trimestre 2016.
	2.11	Progetto Di Completamento Del Centro Di Educazione Ambientale	€ 950.000,00	€ 819.393,64	<b>Intervento sospeso</b>	Conclusione del progetto prevista al IV trimestre 2016.
	2.12	Riqualificazione ed adeguamento funzionale e ristrutturazione ai fini dell'efficiamento energetico della Casa Comunale di Statte	€ 227.000,00	€ 0,00	<b>Intervento non avviato</b>	Conclusione del progetto prevista al I trimestre 2017.
<b>TOTALE</b>			<b>€ 161.000.759,70</b>	<b>€ 17.713.204,56</b>		



# Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Settore Infrastrutture Portuali e Trasporti

Gli interventi destinati ad infrastrutture portuali e trasporti sono 5. E' il settore che incide maggiormente sul CIS sia in termini di risorse finanziate (41,3% del totale CIS), con un importo complessivo pari a circa 417M€, che di spesa realizzata con un importo pari a circa 270 M€ (26,8% del totale finanziato CIS).

SETTORE INFRASTRUTTURE PORTUALI E TRASPORTI						
Stato di avanzamento fisico procedurale	Cod. CIS	Titolo Intervento	Costo Intervento (€)	Costo realizzato al IV trimestre 2018 (€)	Commento sullo stato di attuazione	Previsioni dichiarate alla sottoscrizione
Concluso	1.6	Riqualificazione del molo Polisettoriale del Porto di Taranto - Ammodernamento della banchina di ormeggio	€ 75.000.000,00	€ 62.238.759,88	Tutte le opere sono state ultimate a giugno 2017 e collaudate nel mese di novembre 2017	Collaudo previsto entro I trimestre 2017 (febbraio 2017).
In corso di realizzazione (3 interventi per un importo complessivo pari a 327 M€)	1.7	Intervento per il dragaggio di 2,3 Mm <sup>c</sup> di sedimenti in area Polisettoriale e per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto	€ 83.000.000,00	€ 22.033.152,67	Lavori in esecuzione. Fine lavori previsto entro I trimestre 2020.	Inizio lavori previsto entro I trimestre 2016 (gennaio)
	1.8	Piastra Logistica integrata nodo infrastrutturale Porto di Taranto	€ 219.144.000,00	€ 180.094.419,25	Lavori in esecuzione. Collaudo previsto entro agosto 2019.	Collaudo previsto entro II trimestre 2018 (giugno 2018).
	1.11	Collegamento ferroviario del complesso del Porto di Taranto con la Rete nazionale	€ 25.500.000,00	€ 6.012.628,94	Per il I Lotto si prevede che i lavori possano iniziare nel III trimestre 2019. I lavori del Lotto II sono iniziati ad ottobre 2018 per quanto concerne la Fase A delle attività. Il collaudo è previsto per il IV trim 2020.	Progetto non presente alla data di stipula. Entrato nel CIS a luglio 2016. Inizio progettazione esecutiva I trimestre 2017.
In progettazione	2.7	Riqualificazione del molo polisettoriale - nuova diga foranea di protezione del porto fuori rada di Taranto - tratto di ponente	€ 14.000.000,00	€ 36.258,73	E' in corso l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza. Collaudo previsto entro il II trim 2021	Inizio previsto monitoraggio ante operam III trimestre 2015.
<b>TOTALE</b>			<b>€ 416.644.000,00</b>	<b>€ 270.415.219,47</b>		

## Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Settore Sanità

Il CIS persegue l'obiettivo legato al miglioramento ed al potenziamento dei servizi sanitari sul territorio attraverso l'intervento 2.8 "Realizzazione del Nuovo Ospedale "S. Cataldo" di Taranto" e l'intervento 5.1 relativo all'«Ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici» per un totale di 277 Mln di euro

SETTORE SANITA'						
Stato di avanzamento fisico procedurale	Cod. CIS	Titolo Intervento	Costo Intervento (€)	Costo realizzato al IV trimestre 2018 (€)	Commento sullo stato di attuazione	Previsioni dichiarate alla sottoscrizione
In affidamento	2.8	Realizzazione del Nuovo Ospedale "S. Cataldo" di Taranto	€ 207.500.000,00	€ 4.300.000,00	E' in corso la verifica di anomalia dell'offerta. Si veda la scheda allegata. Stipula presunta contratto luglio 2019.	Pubblicazione bando per esecuzione lavori previsto II trimestre 2016.
In progettazione	5.1*	Ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico - diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche e formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.	€ 70.000.000,00	€ 0,00	Sono in corso di avvio/ aggiudicazione definitiva delle n.18 sub-procedure CONSIP per l'acquisizione delle dotazioni tecnologiche	Progetto non presente alla data di stipula. Entrato nel CIS a luglio 2017. Pubblicazione bandi acquisizione beni e servizi (IV trimestre 2017).
<b>TOTALE</b>			<b>€ 277.500.000,00</b>	<b>€ 4.300.000,00</b>		

\* I dati inseriti fanno riferimento al cronoprogramma delle attività relativo all'ultima scheda di monitoraggio trasmessa dal Ministero della Salute in occasione del monitoraggio al 30 settembre 2017.

# Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Settore Rigenerazione Urbana

8 sono gli interventi che nell'ambito del CIS sono ascrivibili al settore della Rigenerazione Urbana, tutti di responsabilità del Comune di Taranto per un valore complessivo degli investimenti pari a circa 92 milioni di euro.

SETTORE RIGENERAZIONE URBANA						
Stato di avanzamento fisico procedurale	Cod. CIS	Titolo Intervento	Costo Intervento (€)	Costo realizzato al IV trimestre 2018 (€)	Commento sullo stato di attuazione	Previsioni dichiarate alla sottoscrizione
Concluso	2.13	Bonifica aree Foresta Urbana - Quartiere Tamburi	€ 1.954.054,40	€ 1.510.419,80	Intervento concluso e collaudato. Collaudo IV trimestre 2017	Fine lavori previsto il III trimestre 2016.
In progettazione (3 interventi per un totale di circa 7,8 Mln €)	2.16	Intervento di recupero Palazzo Carducci	€ 2.118.917,50	€ 0,00	E' stata aggiudicata la gara per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Inizio lavori previsto il IV trimestre 2016.
	2.17	Intervento di recupero Palazzo Troilo	€ 3.631.475,50	€ 0,00	E' stata aggiudicata la gara per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Inizio lavori previsto il IV trimestre 2016.
	2.18	Intervento di recupero edificio in Via Garibaldi	€ 2.084.970,00	€ 0,00	E' stata aggiudicata la gara per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Inizio lavori previsto il IV trimestre 2016.
In riprogrammazione (4 interventi per un totale di circa 82 Mln €)	2.14	Foresta Urbana - Quartiere Tamburi	€ 6.850.945,60	€ 0,00	<b>Intervento non avviato</b>	Inizio lavori previsto il I trimestre 2017.
	2.15	Housing Sociale per la costruzione di 154 alloggi ERP - Quartiere Tamburi	€ 15.195.000,00	€ 0,00	Intervento non avviato E' in fase conclusiva l'iter di riprogrammazione. Si veda la scheda allegata	Inizio lavori previsto il IV trimestre 2016.
	2.19	Edilizia residenziale	€ 20.000.000,00	€ 0,00	Intervento non avviato E' in fase conclusiva l'iter di riprogrammazione. Si veda la scheda allegata	Inizio lavori previsto il II trimestre 2018.
	2.21	Rigenerazione Urbana - Quartiere Tamburi	€ 40.000.000,00	€ 0,00	Intervento non avviato E' in fase conclusiva l'iter di riprogrammazione. Si veda la scheda allegata	Inizio lavori previsto il III trimestre 2017.

## Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Settore Riqualficazione e adeguamento edifici scolastici

Gli interventi destinati alla riqualficazione e all'adeguamento degli edifici scolastici ricadenti nel quartiere Tamburi del Comune di Taranto rappresentano circa l'1% del totale delle risorse finanziarie del CIS (importo complessivo pari a circa 9,4 M€).

SETTORE RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI						
Stato di avanzament o fisico procedurale	Cod. CIS	Titolo Intervento	Costo Intervento (€)	Costo realizzato al IV trimestre 2018 (€)	Commento sullo stato di attuazione	Previsioni dichiarate alla sottoscrizione
Concluso (6 interventi per un importo complessivo pari a 8,3 M€)	1.1	Riqualficazione e adeguamento termico-impiantistico della scuola "G. Deledda" sita alla via G. Deledda 65/B - Quartiere Tamburi	€ 2.251.245,20	€ 2.043.862,89	Intervento concluso. Collaudo terminato il I trimestre 2016	Collaudo previsto il I trimestre 2016
	1.2	Riqualficazione e adeguamento termico-impiantistico della scuola "U. De Carolis", al Quartiere Tamburi	€ 1.665.845,20	€ 1.284.330,95	Intervento concluso. Certificato di collaudo redatto nel IV trimestre 2016	Collaudo previsto il II trimestre 2016
	1.3	Riqualficazione e adeguamento termico-impiantistico della scuola "Gabelli", al Quartiere Tamburi	€ 875.745,20	€ 733.411,01	Intervento concluso. Collaudo previsto nel IV trimestre 2018	Collaudo previsto il II trimestre 2016
	1.4	Riqualficazione e adeguamento termico-impiantistico della scuola "E. Giusti", al Quartiere Tamburi.	€ 1.309.745,20	€ 1.052.131,04	Intervento concluso. Certificato di collaudo redatto nel II trimestre 2017	Collaudo previsti il IV trimestre 2016
	1.5	Riqualficazione e adeguamento termico-impiantistico della scuola "G. B. Vico", via ss. Angeli custodi al Quartiere Tamburi	€ 2.075.895,20	€ 1.842.302,87	Intervento concluso. Certificato di collaudo redatto nel IV trimestre 2016	Collaudo previsto il II trimestre 2016
	2.4	Caratterizzazione, Analisi di Rischio e Bonifica Aree a verde delle Scuole Deledda, De Carolis e D'Aquino nel Quartiere Tamburi	€ 106.240,30	€ 75.751,33	Concluso nel I trimestre 2016 prima di effettuare l'attività di bonifica a seguito dell'esito negativo dell'analisi rischio	Conclusione prevista IV trimestre 2016
In affidamento	5.7	Aree esterne alle scuole: riqualficazione e sistemazione funzionale delle aree esterne dei plessi scolastici «G.B. Vico». «U. De Carolis», «G. Deledda», «E. Giusti» e «A. Gabelli»	€ 1.173.835,62	€ 2.196,00	Avviata la procedura di gara per l'affidamento di lavori. In corso commissione per la valutazione delle offerte	Progetto non presente alla data di stipula. Inserito nel CIS nel III trim 2018.
<b>TOTALE</b>			<b>€ 9.458.551,92</b>	<b>€ 7.033.986,09</b>		

## Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Settore Riqualficazione, adeguamento impianti produttivi e valorizzazione turistica Arsenale Militare

L'intervento di recupero infrastrutturale e adeguamento degli impianti produttivi dell'Arsenale (Cod. CIS 4A), risulta in esecuzione al 31 dicembre 2018. In particolare, sono conclusi i lavori di "Completamento e ristrutturazione della Officina Polifunzionale 1" e "Adeguamento capannone deposito temporaneo rifiuti speciali". Risultano invece in esecuzione gli interventi di "Adeguamento del bacino Ferrati" e di «Ristrutturazione dell'Officina 4». Per quanto concerne invece l'intervento Cod. CIS 5.2, è attualmente in fase di progettazione.

SETTORE RECUPERO INFRASTRUTTURALE E VALORIZZAZIONE TURISTICA ARSENALE MILITARE						
Stato di avanzamento fisico procedurale	Cod. CIS	Titolo Intervento	Costo Intervento (€)	Costo realizzato al IV trimestre 2018 (€)	Commento sullo stato di attuazione	Previsioni dichiarate alla sottoscrizione
In esecuzione	4.A	Recupero Infrastrutturale e adeguamenti impianti dell'Arsenale Militare	€ 37.193.000,00	€ 3.643.264,49	Sono conclusi i lavori di "Completamento e ristrutturazione della Officina Polifunzionale 1" e "Adeguamento capannone deposito temporaneo rifiuti speciali". Risultano invece in esecuzione gli interventi di "Adeguamento del bacino Ferrati" e di «Ristrutturazione dell'Officina 4»	Inizio lavori III trimestre 2017
In progettazione	5.2	Progetto per la valorizzazione turistico culturale dell'Arsenale Militare di Taranto	€ 5.700.000,00	€ 0	Intervento articolato in 7 sotto-progetti tutti in fase di progettazione.	Al momento della sottoscrizione, l'intervento necessita del progetto di fattibilità tecnico-economica.
<b>TOTALE</b>			<b>€ 42.893.000,00</b>	<b>€ 3.643.264,49</b>		

## Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Settore Beni e attività culturali per la promozione turistica

L'obiettivo legato alla valorizzazione di beni e attività culturali per la promozione turistica è perseguito dal CIS Taranto attraverso la realizzazione di due interventi di responsabilità del MIBACT che risultano conclusi.

SETTORE BENI E ATTIVITA' CULTURALI PER LA PROMOZIONE TURISTICA						
Stato di avanzamento fisico procedurale	Cod. CIS	Titolo Intervento	Costo Intervento (€)	Costo realizzato al IV trimestre 2018 (€)	Commento sullo stato di attuazione	Previsioni dichiarate alla sottoscrizione
Concluso	1.9	Lavori di restauro Ex-Convento S. Antonio	€ 5.062.750,57	€ 4.992.430,47	Lavori conclusi il 4/11/2016. Collaudo effettuato il IV trimestre 2016	Collaudo previsto il II trimestre 2016
	1.10	Lavori di restauro e valorizzazione Compendio Santa Maria della Giustizia	€ 1.960.958,14	€ 1.831.195,87	Lavori conclusi il IV trimestre 2016. Collaudo effettuato IV trimestre 2016.	Collaudo previsto il II trimestre 2016
<b>TOTALE</b>			<b>€ 7.023.708,71</b>	<b>€ 6.823.626,34</b>		

## Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Azioni di sistema a supporto dell'accelerazione degli interventi

Il CIS ha previsto l'attuazione di due azioni di sistema a supporto dell'accelerazione degli interventi attraverso l'assegnazione di 2 milioni di euro.

SETTORE AZIONI DI SISTEMA A SUPPORTO DELL'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI						
Stato di avanzamento fisico procedurale	Cod. CIS	Titolo Intervento	Costo Intervento (€)	Costo realizzato al IV trimestre 2018 (€)	Commento sullo stato di attuazione	Previsioni dichiarate alla sottoscrizione
In esecuzione	4.B	Azioni di accelerazione a supporto del CIS	€ 1.500.000,00	€ 0	L'intervento risulta in fase di esecuzione, con, nello specifico la conclusione sia dell'attività di "Analisi di fattibilità per la valorizzazione dell'arsenale militare di Taranto", sia del "Concorso di idee per finalizzato alla definizione della strategia di sviluppo della Città Vecchia di Taranto". E', invece ancora in corso l'attività di accelerazione per lo sviluppo progettuale e la realizzazione degli altri interventi previsti dal CIS.	Conclusione analisi di fattibilità Arsenale Militare prevista il II trimestre 2016. Conclusione del Concorso di idee prevista il II trimestre 2016.
	2.20	Azioni di Sistema a supporto del raggiungimento degli obiettivi del CIS Taranto	€ 500.000,00	€ 0	Sono in corso le attività di supporto.	Avvio delle attività previsto il IV trimestre 2016.
<b>TOTALE</b>			<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 0*</b>		

\* L'avanzamento della spesa del settore "Azioni di sistema a supporto dell'accelerazione degli interventi", di cui agli interventi Cod. CIS 4B e 2.20, è pari a zero sebbene le attività al 31 dicembre 2018 risultino in avanzato stato di attuazione. La relazione di rendicontazione delle attività svolte è in attesa di approvazione formale da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione.

***Focus su interventi significativi***

---



## «Riqualficazione e valorizzazione della Città Vecchia di Taranto»

---

**L'art. 8, comma 1, della Legge 20/2015 prevede l'adozione da parte del Comune di Taranto di un «Piano di Interventi per il recupero, la riqualficazione e la valorizzazione della città vecchia» - Piano Operativo "Cultura e Turismo» - Importo del finanziamento 90 milioni di euro.**

Delibera CIPE n.10 del 28 febbraio 2018

- **Il CIPE con Delibera 100/2015 ha richiamato la realizzazione di un Concorso internazionale di idee che individuasse la strategia per la riqualficazione della Città Vecchia.**
- **Il Piano Interventi per la riqualficazione della Città Vecchia di Taranto, approvato dal Tavolo Istituzionale Permanente del CIS nel mese di gennaio 2018, è stato adottato dal Comune di Taranto con Delibera di Giunta il 12 luglio 2018.**
- **Il Piano individua un primo insieme di interventi prioritari da realizzare (messa in sicurezza, sottoservizi, illuminazione) e rimanda a sue successive integrazioni l'individuazione di ulteriori interventi.**
- **Il CIPE con Delibera n. 10 del 28 febbraio 2018 ha assegnato 90 milioni di euro (risorse MIBAC - FSC 2014-2020) per gli interventi di recupero e riqualficazione del centro storico di Taranto.**
- **Per l'individuazione degli ulteriori interventi da finanziare, il Ministro per i beni culturali ha istituito una specifica Cabina di Regia composta, oltre che dalla competente Soprintendenza dai rappresentanti del Ministro per il Sud, Comune di Taranto, Prefettura e Provincia, che ha già avviato il lavoro di definizione di un sistema univoco e condiviso di interventi per il Centro Storico di Taranto.**

# ***“Progetto di valorizzazione turistico-culturale dell’Arsenale Militare”***

---

Il **“Progetto di valorizzazione turistico-culturale dell’Arsenale Militare”** predisposto dal **MIBAC** e dal **Ministero della Difesa** è stato approvato dal Cipe il **22 dicembre 2017** (delibera 93/2017) per un importo complessivo pari a **35,45 milioni di euro** con l’assegnazione al **Ministero della Difesa** della **prima tranche di risorse pari a 5,7 milioni di euro** da destinare a:

- *progettazione e realizzazione “Entry Point: punto espositivo e di accoglienza” (4,3 milioni di euro).*
- *progettazione dei seguenti interventi (1,4 milioni di euro):*
  - *“Mostra Storica Artigiana dei reperti della Marina Militare”*
  - *“Officina ex Lance e Remi: adeguamento per la fruizione”*
  - *“Allestimento Museo della Civiltà del Mare nell’Officina Piccoli Motori”*
  - *“Esposizione e visita di un sommergibile nell’Officina Forni e Fabbri”*
  - *“Allestimento e valorizzazione del percorso di visita”*

Cronoprogramma del prosieguo delle attività:

- 1. Sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra MIBAC, Ministero della Difesa e Presidente del TIP Taranto (Ministro dello Sviluppo Economico) in corso di perfezionamento.**
- 2. avvio della progettazione dell’Entry Point** entro 12 mesi dall’attivazione del servizio
- 3. procedura di affidamento delle opere** di realizzazione dell’ “Entry Point” entro 21 mesi dalla data di attivazione della progettazione dell’intervento.
- 4. conclusione dei servizi di progettazione** per: a) museo/esposizione Mostra storico-artigiana; b) ripristino area «Officina Settore Scafi»; c) museo della civiltà del Mare (ex Officina “Piccoli Motori”); d) esposizione sommergibile classe Sauro (ex Officina “Forni e fabbri”; e) allestimento percorso di visita presumibilmente entro 12 mesi dall’attivazione della progettazione degli interventi.

## «Il risanamento e la riqualificazione del quartiere Tamburi»

---

A seguito delle interlocuzioni avviate tra gli Uffici di Gabinetto del MISE, del Ministro per il Sud e del MIT, è stata sbloccata la riprogrammazione degli interventi relativi al Quartiere Tamburi.

**Il Piano di risanamento e di riqualificazione**, presentato dal Comune di Taranto, per un importo complessivo pari a **circa 82 milioni di euro** (di cui 1,9 milioni di euro relativi all'intervento 2.13 di «Bonifica aree Foresta Urbana» già concluso), si attua nell'ambito di un **Protocollo di Intesa stipulato dal Comune con Regione Puglia e Arca Jonica**, prevede:

- interventi di bonifica e potenziamento della foresta urbana;
- **housing sociale** nel Quartiere Tamburi (32 alloggi) e nei Quartieri Paolo VI, Trecarrare, San Vito e Salinella (184 alloggi);
- realizzazione di **impianti sportivi e servizi per i cittadini**, per la sistemazione del **lungomare terrazzato** sul Mar Piccolo.

Cronoprogramma del prosieguo delle attività:

1. **presentazione delle schede intervento riprogrammate al Tavolo Istituzionale Permanente** per l'approvazione, anche con procedura scritta, **entro 1 mese**;
2. **avvio della procedura di aggiudicazione definitiva** dei servizi di progettazione propedeutici all'affidamento dei lavori relativi alla **riqualificazione urbana della zona dell'abitato del Quartiere Tamburi**;
3. **avvio della procedura di aggiudicazione definitiva** dei servizi di progettazione propedeutici all'affidamento dei lavori relativi alla **realizzazione di housing sociale** nei Quartieri Salinella e Paolo VI;
4. completamento della **riqualificazione del Quartiere Tamburi**.

## «Realizzazione Nuovo Ospedale San Cataldo»

---

“**Realizzazione del Nuovo Ospedale "S. Cataldo" di Taranto**”, a titolarità della Regione Puglia/ASL Taranto per un costo complessivo è pari a **207,5 milioni di euro**, localizzato a ridosso del centro abitato, lungo la direttrice per Grottaglie, prevede l’allestimento di 715 posti.

Sulla base del Protocollo di Intesa, del 20 giugno 2016, Invitalia è stata attivata dalla Regione Puglia/ASL Taranto come Centrale di Committenza:

In data 28.02.2019 sono state aperte le offerte economiche presentate da parte degli operatori economici partecipanti ed è stata stilata la graduatoria derivante dalla somma dei punteggi ottenuti dagli stessi.

L’offerta presentata dall’operatore risultato primo classificato è risultata anormalmente bassa e sono in corso da parte della società Invitalia le opportune verifiche sulla congruità dell’offerta.

Alla data dell’8 aprile 2019 il RTI primo graduatoria ha fornito i giustificativi a comprova della congruità dell’offerta. A seguito della ricezione della documentazione è in corso, a cura del RUP, la verifica dell’anomalia e solo successivamente potrà essere predisposta la Determina di Aggiudicazione definitiva. A questo devono poi aggiungersi i tempi per lo *stand still* e per i controlli ex art.80 del d.lgs. 50/2016.

La stima per la sottoscrizione del contratto si prevede entro la fine del mese di luglio 2019, fatti salvi ricorsi alla giustizia amministrativa.

Per il mese di maggio 2019 si prevede la pubblicazione della gara per l’affidamento dei servizi di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico dei lavori per un importo pari a € 1.766.917,10.

## «Ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico diagnostici delle strutture sanitarie dei comuni dell'Area di Taranto»

---

**Il progetto per l'«Ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico diagnostici delle strutture sanitarie dei comuni dell'Area di Taranto»** per un importo pari a 70 milioni di euro, previsto dal *DL n.243/2016* è a valere su risorse FSC 2014-2020 è stato approvato dal Tavolo Istituzionale nella riunione del 21 luglio 2017.

Le attività di cui alla presente «Scheda progetto» si articolano in n.18 sottogruppi di fornitura e posa in opera chiavi in mano di apparecchiature e dispositivi medici – diagnostici per le strutture sanitarie pubbliche nonché la formazione e l'aggiornamento professionale del personale sanitario impiegato. Nell'affidamento è, altresì, prevista l'assistenza tecnica full risk di 60 mesi.

### La tempistica di realizzazione:

- è stata aggiudicata la gara per n.2 mammografi per un importo pari a circa 1,2 milioni di euro;
- ad oggi sono in corso n.8 procedure di acquisizione di dotazioni tecnologiche e delle apparecchiature per complessivi 40,5 milioni;
- entro aprile saranno avviate n.8 procedure di acquisizione di ulteriori dotazioni tecnologiche e di apparecchiature per complessivi 23,7 milioni;
- successivamente alla collaudazione della posa di alcune forniture potranno essere bandite n.4 ulteriori procedure di gara per complessivi 3,6 milioni
- entro giugno 2020 previsto il collaudo delle funzionalità delle apparecchiature.

## Interventi critici non avviati/bloccati

4 sono gli interventi del CIS non avviati, per un importo complessivo pari a 15 milioni di euro, per cui si registra una situazione di stallo (sono esclusi gli interventi relativi al Quartiere Tamburi in corso di sblocco).

COD. CIS	Interventi	Soggetto Attuatore	importo finanziato (€)	spesa realizzata al 31.12.2019 (€)	Fonte di finanziamento	Criticità
2.10	Completamento del progetto dell'utilizzo industriale (ILVA) delle acque reflue di Taranto per uso potabile ed irriguo	Acquedotto Pugliese di Taranto	€ 14.000.000,00	€ 716.098,12	Bilancio Regione Puglia - Decreto c.d. Emergenza idrica n. 16 del 22.06.2004 - OPCM 3536/06	Il Progetto preliminare dell'intervento è oggetto di revisione da parte del Tavolo Tecnico Regione/ILVA/APQ. I lavori del Tavolo Tecnico sono stati tuttavia rallentati a causa dell'incertezza circa l'assetto societario dell'ILVA di Taranto; ad oggi potrebbero esserci le condizioni per riconvocare il tavolo tecnico al fine di definire le condizioni per l'avanzamento progettuale delle opere.
2.11	Progetto Di Completamento Del Centro Di Educazione Ambientale	Comune di Statte	€ 950.000,00	€ 819.393,64	Regione Puglia AQP CITTA' CIPE 36/2002 - CIPE 20/2004	Per entrambi gli interventi sussiste l'esigenza di attivare nuove risorse finanziarie (circa 1,5 M€) per consentire il completamento delle opere. A seguito delle valutazioni espresse dal Tavolo Istituzionale del 9 aprile 2018, il Commissario Straordinario per le opere urgenti di bonifica e ambientalizzazione ha avviato l'istruttoria dei progetti al fine di verificarne la finanziabilità. Ad oggi non risultano esserci riscontri rispetto all'esito di tale istruttoria.
2.12	Riqualificazione ed adeguamento funzionale e ristrutturazione ai fini dell'efficientamento energetico della Casa Comunale di Statte	Comune di Statte	€ 227.000,00	-	Fondo Alluvioni Protezione Civile Regione Puglia D.G.R. 1551/2015	
<b>Totale</b>			€ 15.177.000,00	€ 1.535.491,76		
